

# 筏子溪生態綠廊營造計畫工程-計畫範圍(全區)



# 工程簡介 - 概要及緣起

## 上位計畫-筏子溪水域及周邊地區整體環境規劃(109.10)

1. 透過補植綠帶作為緩衝及隔離帶(主要選用台灣原生種) 2. 整合動線將生態環境體驗步道串聯至下游地區，約2.5公里。打造具有生態景觀廊道功能之水岸空間，提供市民親近生態多樣化之自然環境。

### 主要施工項目

#### 植栽工程

喬木：298棵

灌木：52829株

#### 外推跨橋、步道工程

長度：約112m

#### 人行及自行車道工程

長度：約300m



# 工程簡介 - 基本資料

## 工程團隊

主辦機關：臺中市政府水利局

設計單位：合寬建築師事務所

監造單位：宏亞工程顧問有限公司

承攬廠商：大柱營造事業有限公司

工程進度(截至111年6月28日)：

預定進度：14.42%

實際進度：18.18%

細部設計：109.12.03完成

本計畫實際執行廠商

## 工程基本資料

簽約日期：111年1月4日

開工日期：111年2月10日

契約金額：32,300,000元整

預定完工日期：111年12月6日(300日曆天)

本計畫為全國水環境改善計畫(第五批次)核定案件  
核定金額：4,100萬元

# 筏子溪生態綠廊營造計畫工程-計畫範圍(A)

A(起點處)

工區範圍

文字地標

往永春路

往台中高鐵站



# 筏子溪生態綠廊營造計畫工程-計畫範圍(B)

B(永春路路口)

↑  
(筏子溪橋下)  
往向上路


工區範圍

永春路口



# 筏子溪生態綠廊營造計畫工程-計畫範圍(C)

## C(人行跨橋段)

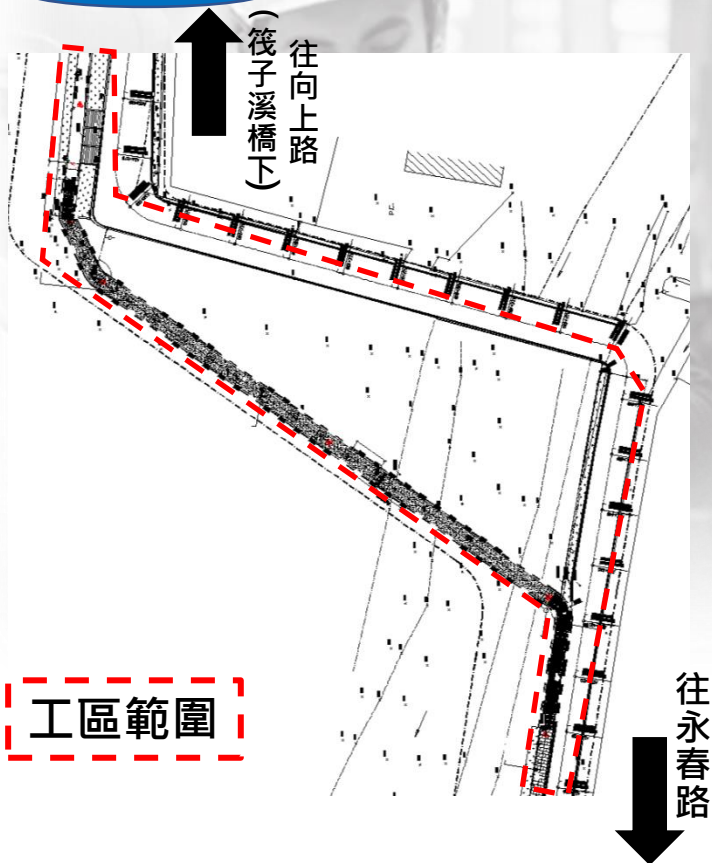

# 筏子溪生態綠廊營造計畫工程-計畫範圍(D)

D(終點處)

筏子溪水文化  
暨環境教育館

工區範圍

往向上路  
(筏子溪橋下)

往五權西路  
(南屯交流道)

